



CHILE LO
HACEMOS
TODOS

ORD. N° 2518 /

ANT.: Carta de fecha 22.08.2018

MAT.: Da respuesta a consultas sobre caminos de la comuna de Pucón.

TEMUCO, 31 AGO. 2018

DE: SR. RODRIGO TOLEDO GUTIERREZ
DIRECTOR DE VIALIDAD REGIÓN DE LA ARAUCANÍA


A: SRES. CAMINOS COMO EL HOYO
MOVIMIENTO CIUDADANO
RFRYDERUP@HOTMAIL.COM
FONO: 953880266

En atención a su ORD. de Ant., en el cual solicita pronunciamiento sobre consulta por varios caminos de la Comuna de Pucón, al respecto informo a Ud. lo siguiente:

1. El Turbio - Caburgua: De acuerdo a lo señalado por el Inspector Fiscal del contrato Sr. Néstor San Martín, el compromiso adquirido en reunión con usuarios del sector, fue comenzar el plan de contingencia para la reparación de los baches más peligrosos con material granular, y en cuanto las condiciones climáticas lo permitan tanto de temperatura y humedad, comenzaran los trabajos definitivos, situación que aún no se ha dado. Por lo anteriormente señalado, se pretende comenzar a trabajar con asfalto la semana del 24 de septiembre, de no mediar inconvenientes climáticos.
Con relación a la comunicación con el Inspector Fiscal se sugiere utilizar los canales formales, documento y/o correo electrónico para acoger sugerencias y/o reclamos con copia al suscrito.
2. Contrato sello y bacheo asfáltico ruta Pichares - Huife: se realizó su apertura técnica con fecha 21.08.2018, y apertura económica el día 28.08.2018, si todos los antecedentes y trámites en contraloría resultan correctos, la empresa adjudicada podría comenzar obras durante el mes de diciembre. Mientras no se realice entrega de terreno a la empresa el camino será atendido mediante Administración Directa, por parte de la oficina Provincial con obras de Bacheo Superficial con mezclas en caliente y pre dosificadas.

DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD REGION DE LA ARAUCANIA

BULNES 897 4° PISO-Temuco - Teléfono (45) 462037 - 462038 - www.vialidad.cl



CHILE LO
HACEMOS
TODOS

3. Puente Liucura: Se realizó una reunión en terreno con el Jefe Provincial de Cautín Sr. Jose Gomez, y dos representantes del sector, acordando realizar obras de saneamiento: cunetas en tierra y fosos, para encauzar las aguas provenientes del camino Pichares Huife, a mano derecha, permitiendo que las aguas no ingresen al predio particular ni crucen al camino adyacente cerca del acceso al puente liucura.

Para poder concretar lo anterior, los representantes del movimiento ciudadano, quedaron en realizar gestiones con el Municipio local para cortar 2 árboles (se explicó que la Dirección de Vialidad no cuenta con los equipos para proceder a ello) que obstruyen poder construir el foso, solucionándose este tema podremos reactivar los compromisos y realizar estas obras en función de que las aguas lluvias no provoquen más daño en ambas rutas.

4. Tercera Vía: cabe señalar que no es una tercera vía, es una berma o sobre ancho de la calzada existente, que se encuentra entregada y está coordinada su demarcación cuando las condiciones climáticas lo permitan, será realizada por el contrato global vigente.

5. Puentes Administración Directa: durante el presente año se construyeron los puentes Pitracó localizado en el camino Cristo Carhuello Quelhue, fecha de término 15.06.2018 y el puente Huepil en el camino Caburgua Huepil fecha de término 19.07.2018, además de realizar la reparación de los puentes Palguin Alto camino Acceso a termas de Palguin(17.08.2018) y puente Coilaco camino Pichares Lago San Jorge (24.07.2018). Puente el Seco, se encuentra priorizado para el año 2019, de existir recursos adicionales y disponibilidad de mano de obra se atenderá antes de fines de año vía administración directa Provincia de Cautín. El puente Luengo, no es tuición de la Dirección de Vialidad.

6. Puente Metreñehue: las obras del puente no están retrasadas, toda vez que debido a obras adicionales necesarias, el contrato de reparación de la estructura dispone de una extensión de plazo legal al 14.10.2018. Lo anterior para que la empresa constructora finalice las obras respectivas. El plazo puede ser extendido al mes de noviembre si existen problemas producto de las condiciones climáticas, ya que su carpeta es asfalto.

7. Ruta sector Carhuello: Este contrato posee un 40% de su avance físico en obras, se estima durante el mes de diciembre del presente año tener concluida las obras de asfalto tipo Cape Seal, para realizar sus terminaciones a inicios del año 2019. Indicar que la empresa no tiene deudas con sus trabajadores, sus sueldos están canceladas. Indicar finalmente que existen los acuerdos con el municipio local para, durante el mes de septiembre, comenzar a preparar el plan de mitigación de tránsito para el verano 2019 a objeto que las obras en ejecución provoquen el menor impacto tanto a los habitantes de Pucon como a los turistas. Estas reuniones serán efectuadas con las instituciones competentes en la materia.

DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD REGION DE LA ARAUCANIA

BULNES 897 4° PISO-Temuco – Teléfono (45) 462037 – 462038 – www.vialidad.cl



CHILE LO
HACEMOS
TODOS

Se adjunta además los caminos que se encuentran bajo la administración del Contrato Global, ID: 2261-71-LR17, la cual tiene inicio 28.06.2018 y termino 07.06.2022.

8. Camino Público El claro los Calabozos es vía de evacuación volcánica: es atendido mediante obras de Administración Directa, específicamente con trabajos de conservación vía Reperfilado simple de calzada con una frecuencia de 1 vez por mes. Para el próximo año 2019 se programó un camino básico tipo doble tratamiento asfáltico, para el citado camino, con las obras de seguridad correspondiente, esta obra será ejecutada por administración directa con recursos propios en una longitud aprox. de 2.5 kms.

9. Camino Segunda Faja: se encuentra en proceso de liquidación del contrato y tras tramitarlo administrativamente se procederá a realizar un trato directo, se estima si todo anda bien, tener una nueva empresa adjudicada en diciembre del presente año, para retomar obras durante Enero del 2019.

10. Camino Acceso al Volcán: es atendido vía administración directa a través de la oficina Provincial de Vialidad Cautín, no se encuentra en ningún contrato a corto plazo de reposición de su asfalto. Para el presente año y el próximo se consideran obras de bacheo asfáltico en caliente y con mezclas pre dosificadas en frío.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

RODRIGO TOLEDO GUTIERREZ
~~CONSTRUCTOR CIVIL~~
DIRECTOR REGIONAL DE VIALIDAD
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

RTG/cyv

DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario
- SEREMI MOP Región de la Araucanía
- Jefe Conservación y Ad.m. Directa Región de la Araucanía
- Jefe Dpto. de Contratos Región de la Araucanía
- Jefe Provincial de Vialidad Cautín
- Oficina de Partes Regional
- Oficina de Partes Vialidad Cautín


Proceso N° 2293883 /

DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD REGION DE LA ARAUCANIA

BULNES 897 4° PISO-Temuco – Teléfono (45) 462037 – 462038 – www.vialidad.cl

“CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS, DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN, SECTOR CORDILLERA, ETAPA II, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”. SAFI: 274,052

Nº	CÓDIGO	NOMBRE DEL CAMINO	TIPO DE RED	KMS POR COMUNA				
				FREIRE	VILLARRICA	PUCÓN	CURARREHUE	KM
1	69B-199	FRANCISCO VALDÉS SUBERCASEAUX	BÁSICA	29,300	35,802	32,000	36,102	133,204
2	69C-905	EL TURBIO - CABURGUA	BÁSICA	0,000	0,000	14,300	0,000	14,300
3	69D-923	RÍO PUCÓN - MENETÚE	PRIMARIA	0,000	0,000	21,600	0,000	21,600
4	69D-004	ACCESO TERMAS DE PALGUÍN	PRIMARIA	0,000	0,000	10,900	0,000	10,900
5	69D-947	CATRAPULLI - RINCONADA	PRIMARIA	0,000	0,000	0,000	12,700	12,700
6	69D-969	CURARREHUE - ACCESO TERMAS PANGUE	PRIMARIA	0,000	0,000	0,000	18,800	18,800
7	69D-965	CURARREHUE - REIGOLL - RÍO BLANCO	PRIMARIA	0,000	0,000	0,000	51,100	51,100
8	69E-899	ACCESO BALSA QUELHUE	PRIMARIA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	69E-841	CRISTO - CARHUELLO - QUELHUE - RÍO DE LA PLATA	SECUNDARIA	0,000	0,000	2,700	0,000	2,700
10	69E-805	CABURGUA - HUEPI	SECUNDARIA	0,000	0,000	17,340	0,000	17,340
11	69E-875	PALLACO RENAHUE	SECUNDARIA	0,000	0,000	10,300	0,000	10,300
12	69E-807	PALLACO - LAGO TILQUILCO (ACCESO PARQUE HUERQUEHUE)	SECUNDARIA	0,000	0,000	6,920	0,000	6,920
13	69E-801	CABURGUA - PLAYA BLANCA	SECUNDARIA	0,000	0,000	6,700	0,000	6,700
14	69E-118	ACCESO PALGUÍN BAJO	SECUNDARIA	0,000	0,000	2,300	0,000	2,300
15	69E-571	PALGUÍN BAJO - LONGOFILO	SECUNDARIA	0,000	0,000	2,500	0,000	2,500
16	69E-917	CATRAPULLI - LAGUNA LONGOFILO	SECUNDARIA	0,000	0,000	5,600	0,000	5,600
17	69E-953	ACCESO TERMAS DE SAN LUIS	SECUNDARIA	0,000	0,000	0,000	6,300	6,300
18	69E-901	LOS SAUCES - RELICURA	SECUNDARIA	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000
19	69E-569	CATRAPULLI - SANTA ELENA	SECUNDARIA	0,000	0,000	5,700	3,800	9,500
20	69E-919	MACHIN - RESBALOSO	SECUNDARIA	0,000	0,000	3,900	0,000	3,900
21	69E-961	CURARREHUE - HUINCAPALIHUE	SECUNDARIA	0,000	0,000	0,000	4,300	4,300
22	69E-903	HUINCAPALIHUE - QUINENAHUIN	SECUNDARIA	0,000	0,000	0,000	8,500	8,500
23	69E-971	PUALA - PUALA ALTO	SECUNDARIA	0,000	0,000	0,000	17,000	17,000
24	69E-983	CURARREHUE - CAREN	SECUNDARIA	0,000	0,000	0,000	5,700	5,700
25	69E-977	CAREN - ANIHUARRAQUI	SECUNDARIA	0,000	0,000	0,000	12,380	12,380
TOTAL KILÓMETROS POR COMUNA				29,300	35,802	144,760	178,582	388,444



MINUTA DE CONTRATO
Al 31/7/2018

DIRECCION DE VIALIDAD
REGION DE LA ARAUCANIA
PROV. CAUTIN

Antecedentes Generales del Contrato

CONTRATO				AMBITO	SAFI
Obra "Conservación Camino Básico Carhuello - Quelhue , Comuna de Pucón, Provincia de Cautín , Región de La Araucanía"					272803
REGION	PROVINCIA	FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	RESIDENTE	
DE LA ARAUCANIA	CAUTIN	SECTORIAL	Sociedad de Servicios Generales y Const. Ltda.	C.C. MARCO PINTO CORREA	
RES. ADJUDICATORIA	TIPO LICITACION	REAJUSTE	TECNICA	ECONOM.	TRAMITE
DRV Nº105 del 7/12/2017	PUBLICA	IPC	14/9/2017	21/9/2017	19/2/2018
Montos del Contrato				IND. BASE	AGO-17

PPTO. OFICIAL	PPTO. INICIAL	MOD. TRAMITADAS	VALOR ACTUAL	MOD. PREAPROBADA	VALOR ACTUAL EN TRAMITE
\$ 689.668.453	\$ 697.983.155	\$ 689.668.453	\$ 1.387.651.608	\$ 0	\$ --

Plazos del Contrato

FECHA INICIO	PLAZO INICIAL	AUMENTO PLAZO	FECHA VENC.	AUMENTO PLAZO PREAPROBADO	VENC. EN TRAMITE
20/2/2018	300 (Días)	300 (Días)	12/10/2019 *	0 (Días)	--

Inspector Fiscal y Asesoría del Contrato

INSPECTOR FISCAL	VISITADOR	ASESORIA	RESIDENTE DE LA ASESORIA
C.C. CECILIA ANDREA OPAZO BELLO	no hay	no hay	no hay

Descripción del Contrato

El Presente proyecto corresponde a la conservación del camino básico Ruta Sin Rol Cristo Carhuello - Quelhue, Tramo del Dm 0,000 al Dam 5.000 , emplazado administrativamente en la comuna de Pucón, provincia de Cautín, Región de la Aarucanía.


Observaciones del Contrato ::Periodo: JULIO del 2018

no def.


Mano de Obra y Avances del Contrato ::Periodo: JULIO del 2018

M.OBRA CALIFICADA	M.OBRA SEMI-CALIFICADA	M.OBRA NO CALIFICADA	FISICO.ACUM.	FINANC.ACUM.
Hombres 4; Mujeres 2 ; Total 6	Hombres 7; Mujeres 0 ; Total 7	Hombres 7; Mujeres 0 ; Total 7	45%	16,20 %

Mapa de Ubicación Geográfica

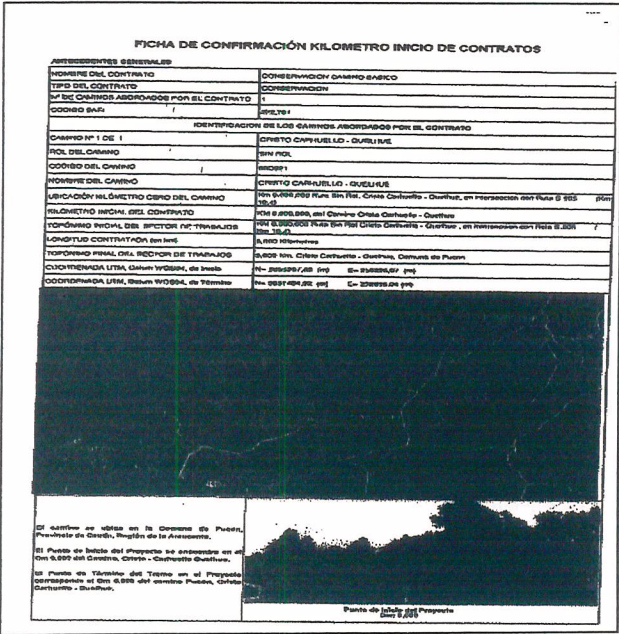

Programa de Trabajo v/s Avance Real(Av. Fisico)

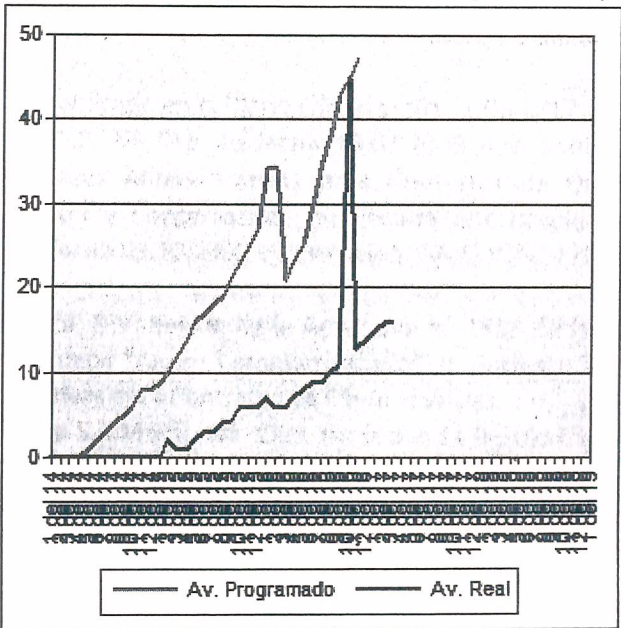

* Para calcular el término del plazo vigente, se considera el plazo inicial mas los aumentos aprobados por Resolución
FUENTE : SAC_ : SAC_VIALIDAD (cecilia.opazo)



MINUTA DE CONTRATO

AI 31/7/2018

DIRECCION DE VIALIDAD

REGION DE LA ARAUCANIA

PROV. CAUTIN

Antecedentes Generales del Contrato

CONTRATO				AMBITO	SAFI
REPARACION PUENTE METREÑEHUE,KM 3.1.RUTA S-905 COMUNA PUCON. PROVINCIA DE CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA					254723
REGION	PROVINCIA	FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	RESIDENTE	
DE LA ARAUCANIA	CAUTIN	SECTORIAL	RCN INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L	C.C. ALONSO SALORT BIZAMA	
RES. ADJUDICATORIA	TIPO LICITACION	REAJUSTE	TECNICA	ECONOM.	TRAMITE IND. BASE
DRV N°36 del 2/5/2017	PUBLICA	IPC	15/12/2016	22/12/2016	11/7/2017 NOV-16

Montos del Contrato

PPTO. OFICIAL	PPTO. INICIAL	MOD. TRAMITADAS	VALOR ACTUAL	MOD. PREAPROBADA	VALOR ACTUAL EN TRAMITE
\$ 695.998.871	\$ 695.998.871	\$ 136.033.184	\$ 832.032.055	\$ 0	\$ --

Plazos del Contrato

FECHA INICIO	PLAZO INICIAL	AUMENTO PLAZO	FECHA VENC.	AUMENTO PLAZO PREAPROBADO	VENC. EN TRAMITE
12/7/2017	360 (Días)	100 (Días)	14/10/2018 *	0 (Días)	--

Inspector Fiscal y Asesoría del Contrato

INSPECTOR FISCAL	VISITADOR	ASESORIA	RESIDENTE DE LA ASESORIA
I.C. RICARDO GONZALO PEREZ BARRIA	no hay	no hay	no hay

Descripción del Contrato

Puente Metreñehue se ubica sobre el rio trancura Ruta S-905 Pucon- Caburgua , en la actualidad tiene una long. de 72 mts, sin embargo dicha estructura corresponde a 2 puentes de simple via contruidos, uno al lado de otro. ambas calzadas quedaron separadas por el pasillo del puente que se construyo primero de tal modo de que el pasillo queda transformado en una barrera que separa y divide la calzada del puente que debiera ser de 9 mts.


Observaciones del Contrato ::Periodo:ENERO del 2018

no def.

Mano de Obra y Avances del Contrato ::Periodo:ENERO del 2018

M.OBRA CALIFICADA	M.OBRA SEMI-CALIFICADA	M.OBRA NO CALIFICADA	FISICO.ACUM.	FINANC.ACUM.
Hombres 6; Mujeres 0 ; Total 6	Hombres 4; Mujeres 0 ; Total 4	Hombres 18; Mujeres 0 ; Total 18	27,80%	23,38 %


Mapa de Ubicación Geográfica

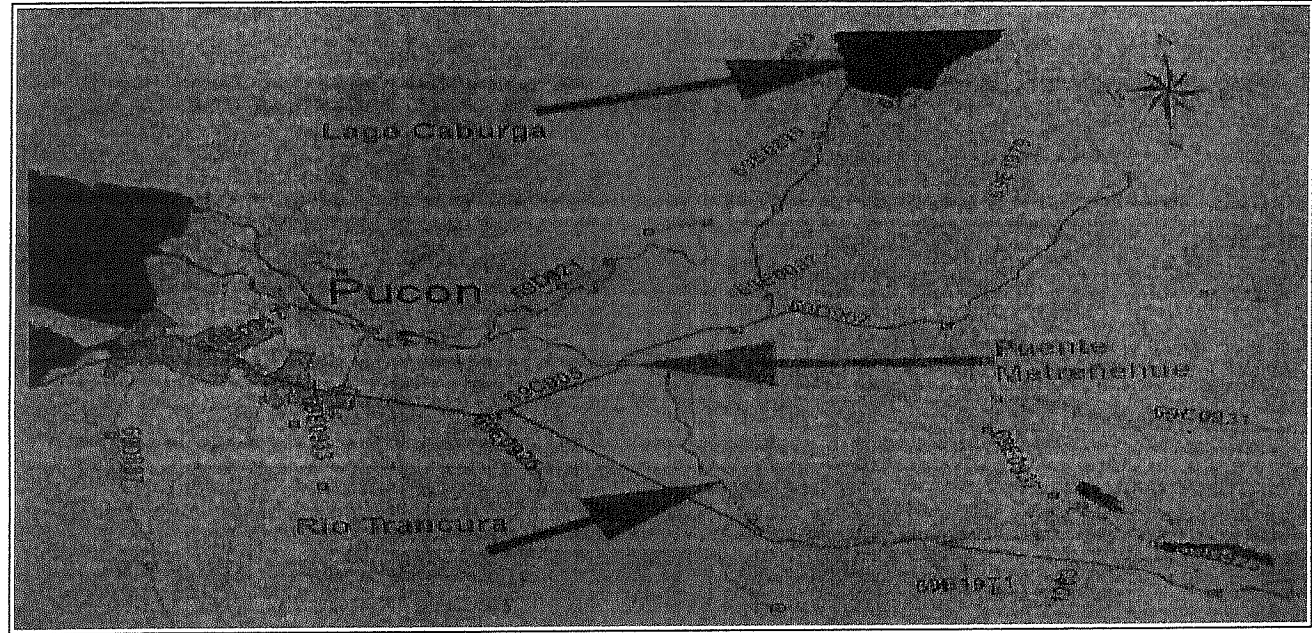

* Para calcular el término del plazo vigente, se considera el plazo inicial mas los aumentos aprobados por Resolución

FUENTE : SAC_ : SAC_VIALIDAD (Jaime.Alvarado)

FECHA : 31-08-2018 10:44:50



MINUTA DE CONTRATO
Al 31/7/2018

DIRECCION DE VIALIDAD
REGION DE LA ARAUCANIA
PROV. CAUTIN

Antecedentes Generales del Contrato

CONTRATO				AMBITO	SAFI
Conservación Sello y Bacheo Asfáltico Cruce Ruta 199CH - Lago Caburgua, Comuna de Pucón , Provincia de Cautín, Región de La Araucanía				1382	273176
REGION	PROVINCIA	FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	RESIDENTE	
DE LA ARAUCANIA	CAUTIN	SECTORIAL	CONSTRUCTORA REMAVESA S.A.	no def.	
RES. ADJUDICATORIA	TIPO LICITACION	REAJUSTE	TECNICA	ECONOM.	IND. BASE
DV N°6 del 21/2/2018	PUBLICA	IPC	10/11/2017	17/11/2017	ENE-18

Montos del Contrato

PPTO. OFICIAL	PPTO. INICIAL	MOD. TRAMITADAS	VALOR ACTUAL	MOD. PREAPROBADA	VALOR ACTUAL EN TRAMITE
\$ 1.909.574.260	\$ 1.741.576.976	\$ 0	\$ 1.741.576.976	\$ 0	\$ --

Plazos del Contrato

FECHA INICIO	PLAZO INICIAL	AUMENTO PLAZO	FECHA VENC.	AUMENTO PLAZO PREAPROBADO	VENC. EN TRAMITE
30/4/2018	240 (Días)	0 (Días)	25/12/2018	0 (Días)	--

Inspector Fiscal y Asesoría del Contrato

INSPECTOR FISCAL	VISITADOR	ASESORIA	RESIDENTE DE LA ASESORIA
C.C. Nestor San Martin Ulloa	no hay	no hay	no hay

Descripción del Contrato

El camino se ubica en la comuna de pucón , provincia de cautín , región de la araucania , el punto de inicio del proyecto se encuentra en el DM 0.000 en la intersección de el turbio hacia curarrehue.
El punto de término del tramo en proyecto corresponde al DM 13.820 del mismo camino hacia caburgua


Observaciones del Contrato ::Periodo:JULIO del 2018

no def.


Mano de Obra y Avances del Contrato ::Periodo:JULIO del 2018

M.OBRA CALIFICADA	M.OBRA SEMI-CALIFICADA	M.OBRA NO CALIFICADA	FISICO.ACUM.	FINANC.ACUM.
Hombres 0; Mujeres 0 ; Total 0	Hombres 12; Mujeres 1 ; Total 13	Hombres 0; Mujeres 0 ; Total 0	0%	0 %

Mapa de Ubicación Geográfica

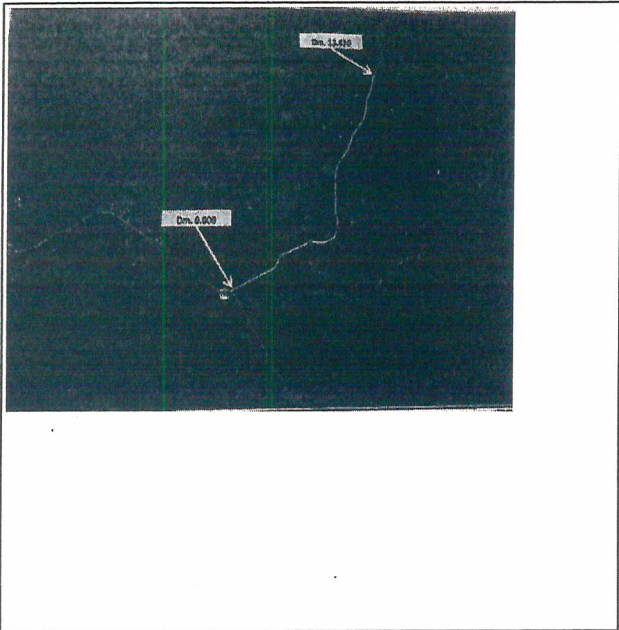

Programa de Trabajo v/s Avance Real(Av. Físico)

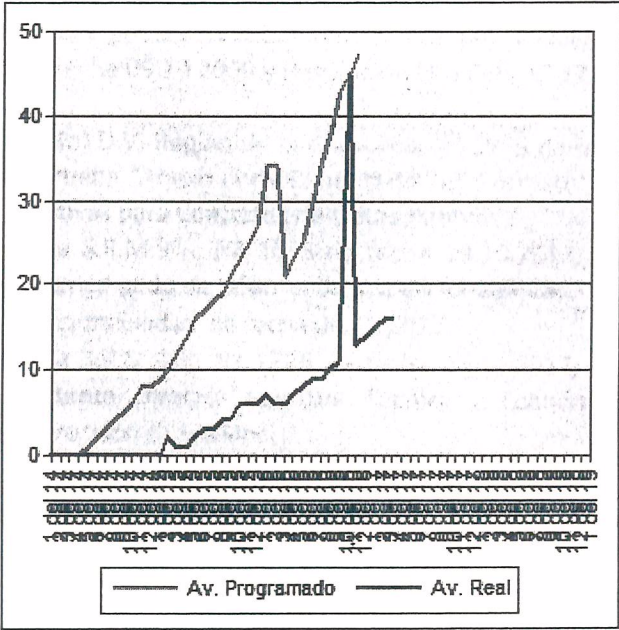

FUENTE : SAC_ : SAC_VIALIDAD (ana.umaña)

FECHA : 31-08-2018 11:14:07
